

Que tu empresa opere con la solidez que hace crecer a tu gente.

Casos de uso en HubSpot



Coopesiba

PROPUESTA

PC-2026-0001

FECHA

[DD] de [mes] de [año]

VIGENCIA

30 días

PREPARADA POR

[Nombre] · Dinterweb

RESUMEN

PAQUETE DE CRÉDITOS

40 créditos

INVERSIÓN

US\$ 3,000

Un solo pago contra activación del servicio.

CASOS DE USO POR ETAPA


El trabajo se organiza en casos de uso. Cada uno avanza por tres etapas: Kickoff, donde alineamos objetivos y prioridades; Planificado, lo que ya tiene alcance y criterio de éxito definidos; y Evaluación, lo que se dimensionará durante la ejecución con base en lo que la operación revele.

- Una vez activado el servicio, la sesión de **Kickoff se agenda entre 3 y 7 días**, según la disponibilidad del equipo al momento de la activación.

PLAN DE TRABAJO

Cómo se distribuye la ejecución.

El cronograma es una proyección de referencia. Las fechas exactas se confirman en el Kickoff, y los casos en evaluación se incorporan al plan una vez que su alcance queda definido.

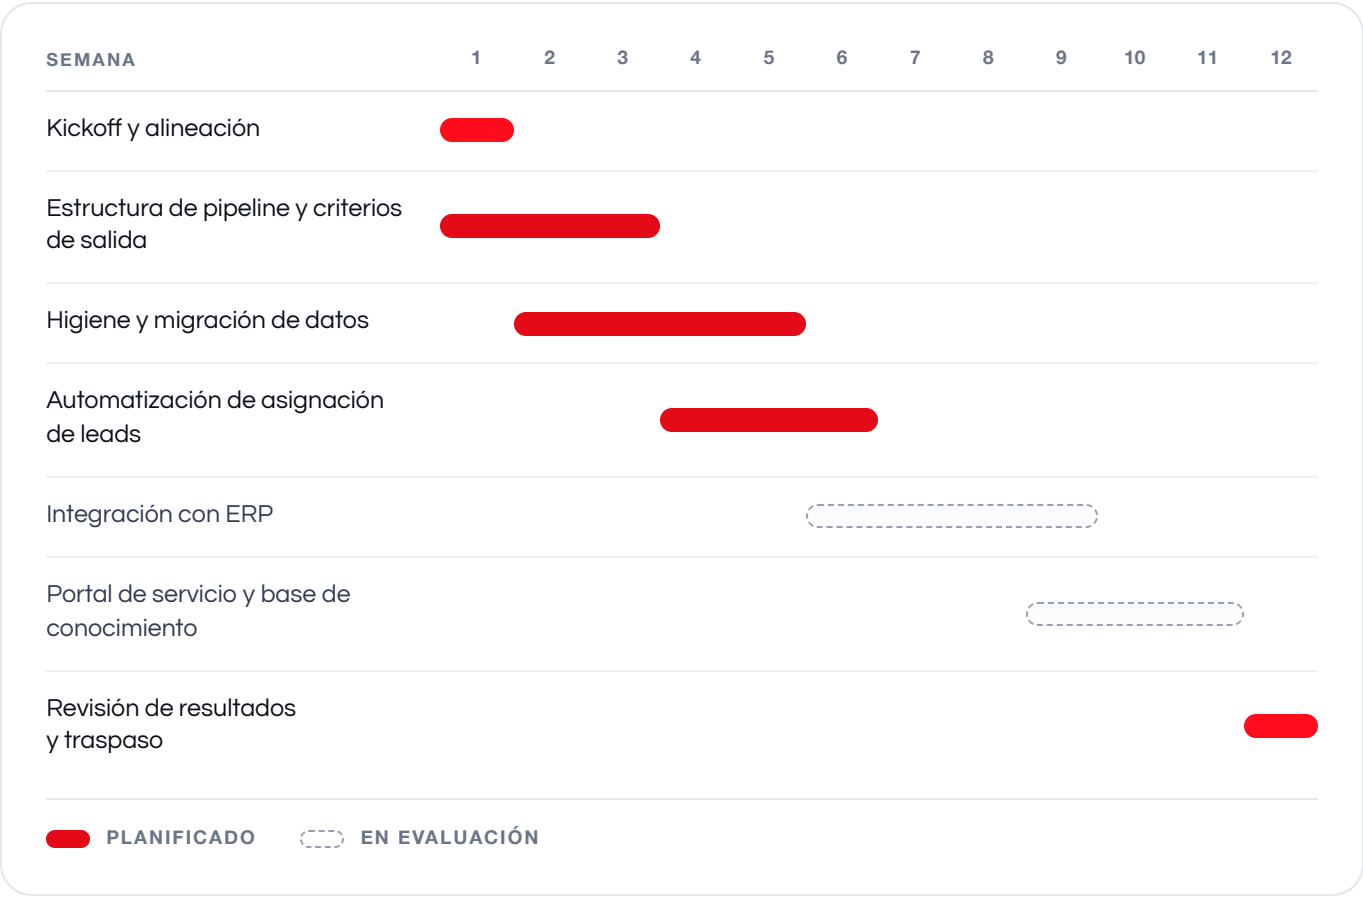

RITMO DE TRABAJO

Sesiones de trabajo de acuerdo con lo requerido en cada caso de uso.

VISIBILIDAD

Avance y consumo de créditos visibles en la plataforma, en todo momento.

CIERRE DE CASO

Un caso se cierra cuando su criterio de éxito queda verificado con el cliente.

GARANTÍA

30 días por cada caso de uso.

- 🛡 Cada caso de uso cuenta con **30 días de garantía de forma individual**, contados desde su activación en la plataforma. La garantía no corre para el proyecto completo al final: corre caso por caso, a medida que cada proceso entra en operación.

Eso permite revisar cada proceso de forma puntual y detallada, con el equipo usándolo en su día a día y con tiempo real para detectar ajustes, en lugar de dejar todas las observaciones para una revisión final, cuando ya es más costoso corregir.

CUBRE

Corrección de errores de configuración en lo entregado

CUBRE

Ajustes por comportamiento distinto al criterio de éxito acordado

CUBRE

Revisión de automatizaciones y reglas que no operen como se definió

No cubre alcance nuevo, cambios de criterio posteriores a la aceptación, ni fallas originadas en sistemas de terceros.

IMPORTANTE · CRÉDITOS Y EJECUCIÓN

La ejecución de los casos de uso incluidos en este plan depende de que existan créditos disponibles. No todos los casos quedan cubiertos de forma automática por el paquete contratado.

Para asegurar que el plan se complete, hay dos caminos: cargar desde el inicio el total de créditos que suman todos los casos de uso, o ir cargando paquetes de créditos de forma progresiva conforme avanza el servicio. Si los créditos se agotan, la ejecución se detiene hasta que se cargue un nuevo paquete.

DESGLOSE

Casos de uso en detalle.

Cada caso de uso se describe con tres elementos: el alcance que asumimos, las responsabilidades del cliente que lo hacen posible, y el criterio de éxito con el que se da por concluido.

KICKOFF · EN EJECUCIÓN

Kickoff de arranque y alineación de prioridades			2 créditos
ALCANCE Sesión de arranque con las áreas involucradas. Revisión del contexto ya disponible en el CRM, confirmación de objetivos del período, priorización de los casos de uso y definición del plan de trabajo inicial.	RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE Confirmar los participantes con capacidad de decisión, reservar el espacio en agenda y dar acceso de administrador al portal de HubSpot.	CRITERIO DE ÉXITO Plan de trabajo confirmado por el cliente, con casos priorizados y responsables asignados por cada lado.	

PLANIFICADO

Estructura de pipeline y criterios de salida

8 créditos

ALCANCE

Definición de las etapas del pipeline con criterios de salida objetivos y verificables. Configuración de propiedades obligatorias, automatizaciones de avance y vista de revisión para el líder comercial.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Acordar internamente el significado de cada etapa, validar los criterios propuestos y comunicar el cambio al equipo comercial.

CRITERIO DE ÉXITO

El pipeline opera con los nuevos criterios y el líder revisa negocios desde la vista configurada, sin apoyo externo.

Higiene y migración de datos de contactos

10 créditos

ALCANCE

Depuración de duplicados, normalización de propiedades clave y carga de la base existente al portal. Definición de las reglas que mantienen el dato limpio como consecuencia del proceso diario.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Entregar la base en el formato acordado, designar a quien valida los datos y confirmar qué registros quedan fuera del alcance.

CRITERIO DE ÉXITO

Base cargada y validada por el cliente, sin duplicados en las propiedades definidas como críticas.

Automatización de asignación de leads

6 créditos

ALCANCE

Reglas de enrutamiento según origen, territorio y capacidad del equipo. Notificaciones al responsable, acuerdos de tiempo de primer contacto y reporte de cumplimiento.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Definir los territorios y la carga por vendedor, y confirmar el tiempo de respuesta esperado con su equipo.

CRITERIO DE ÉXITO

Todo lead nuevo queda asignado automáticamente y el reporte muestra el tiempo de primer contacto por vendedor.

EN EVALUACIÓN

Los casos en evaluación tienen una estimación de referencia. Su alcance final se define durante la ejecución, y cualquier ajuste en créditos se acuerda con el cliente antes de iniciarlos.

Integración con ERP: señales de facturación

≈ 8 créditos

ALCANCE

Definición, flujo por flujo, de qué información del ERP necesita HubSpot para operar: estado de cuenta, despacho y renovación. Sincronización de esas señales, no del detalle contable completo.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Facilitar el acceso técnico al ERP y la documentación de su API, y designar a la contraparte de TI que acompaña las pruebas.

CRITERIO DE ÉXITO

Las señales acordadas llegan a HubSpot en el momento correcto y disparan las reglas de negocio definidas.

Portal de servicio y base de conocimiento

≈ 6 créditos

ALCANCE

Configuración del portal de tickets, categorías y acuerdos de servicio. Estructura de la base de conocimiento para que cada caso resuelto quede disponible para el siguiente.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

Aportar los casos frecuentes documentados, definir los tiempos de respuesta comprometidos y asignar a quien mantiene el contenido.

CRITERIO DE ÉXITO

El equipo atiende tickets desde el portal y la base de conocimiento responde los casos frecuentes acordados.

Total de créditos considerados entre las tres etapas, incluyendo las estimaciones en evaluación.

40 créditos

ALCANCE Y TÉRMINOS

VIGENCIA DE LA PROPUESTA

30 días a partir de la fecha indicada en la portada. Pasado ese plazo, los valores y el plan de trabajo pueden ajustarse.

ACTIVACIÓN Y KICKOFF

Una vez activado el servicio, la sesión de Kickoff se agenda entre 3 y 7 días, según la disponibilidad del equipo al momento de la activación.

USO DE CRÉDITOS

Los créditos se consumen por caso de uso ejecutado y su avance es visible en la plataforma. Al agotarse, la ejecución continúa con la carga de un nuevo paquete.

ALCANCE Y CAMBIOS

Lo no descrito en el desglose no forma parte del alcance. Todo caso adicional se cotiza en créditos y se acuerda antes de iniciarlo.

IMPUESTOS Y PAGO

Los valores se expresan en dólares estadounidenses, antes de impuestos: no incluyen impuestos ni retenciones aplicables en el país del cliente.

LICENCIAS DE HUBSPOT

Esta propuesta cubre servicios de consultoría e implementación. Las licencias de HubSpot y de terceros se contratan por separado.

DEPENDENCIAS

El cronograma asume que las responsabilidades del cliente se cumplen en los tiempos acordados. Los retrasos externos desplazan las fechas proyectadas.

CONFIDENCIALIDAD

El contenido de esta propuesta y la información compartida durante el proyecto se tratan como confidenciales por ambas partes.

El plan de trabajo está disponible en línea, junto con el catálogo completo de casos de uso. Desde ahí también se activa el servicio y se agenda la sesión inicial de Kickoff.

Ver plan de trabajo en línea

<https://app.dinterweb.com/public/prospect/coopesiba-8d4776971e>

POR COOPESIBA

POR DINTERWEB



HUBSPOT ELITE PARTNER · DINTERWEB.COM

Términos y condiciones:
dinterweb.com/terminos
